

Análise de Ferramentas


ONIcreative

Este documento apresenta uma análise detalhada das ferramentas de edição de texto e parágrafo, tomando como referência os recursos disponíveis no Microsoft Word (Figura 01). O objetivo é identificar o que já existe na plataforma atual, o que é tecnicamente viável implementar, o que não é viável neste momento e quais funcionalidades ainda carecem de escopo mais definido.

Cada ferramenta foi avaliada considerando fatores como impacto na diagramação, compatibilidade com a geração de materiais derivados (como ebook e trilha), comportamento dentro do editor atual e necessidades de padronização de formatação. Para as funcionalidades classificadas como viáveis, foram estimados prazos específicos referentes ao desenvolvimento front-end.

Este documento também serve como base para direcionar decisões estratégicas, apoiar a priorização de entregas e alinhar expectativas entre as equipes de Front-end, UX/UI e Produto, especialmente diante das futuras adequações visuais e estruturais previstas para a barra de ferramentas.

Figura 01: Barra de ferramentas de Fonte e Parágrafo

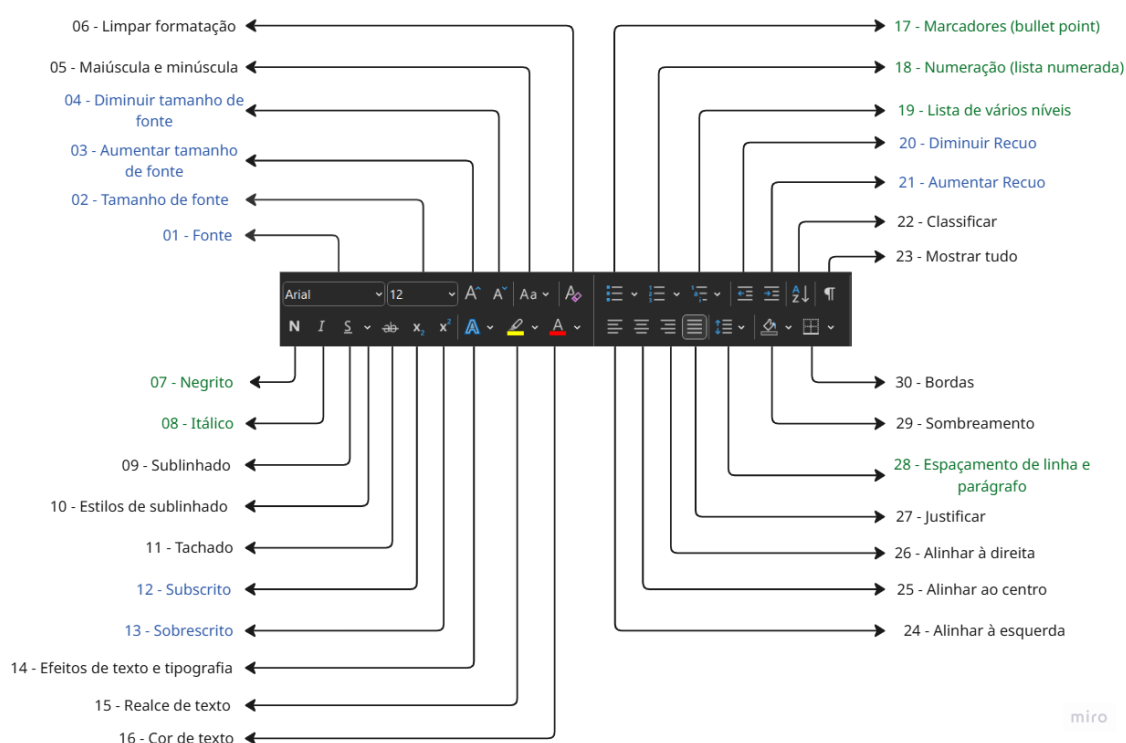

01 – Fonte

Escolhe a família de fonte (Arial, Times New Roman, etc.).

02 – Tamanho de fonte

Define o tamanho do texto (ex: 12, 14, 16).

03 – Aumentar tamanho de fonte

Aumenta alguns pontos no tamanho da fonte selecionada.

04 – Diminuir tamanho de fonte

Diminui alguns pontos no tamanho da fonte selecionada.

Análise: As ferramentas 01, 02, 03 e 04 estão condensadas como estilo padronizado no modelo. É necessário verificar a necessidade de não trabalhar com fonte padrão, visto que ebook e trilha têm fonte padrão.

05 – Maiúscula e minúscula

Converte o texto para maiúsculas, minúsculas, inicial maiúscula, etc.

Análise: retirar *'text-transform'* de tags de texto dentro da caixa de conteúdo.

Prazo previsto: 2 dias

06 – Limpar formatação

Remove todas as formatações, voltando ao texto simples.

Análise: criar função para forçar a formatação para o padrão da ferramenta, retirando eventuais *'styles'* e *'links'* e textos colados de fontes externas. Ao limpar a formatação o texto deve ficar dentro da marcação padrão (tags) para não interferir na diagramação e trilha.

Prazo previsto: 6 dias.

07 – Negrito

Deixa o texto mais forte/espesso.

08 – Itálico

Inclina o texto.

Análise: Ferramentas já implementadas.

09 – Sublinhado

Sublinha o texto.

Prazo previsto: 4 dias.

10 – Estilos de sublinhado

Escolhe tipos de sublinhado (duplo, tracejado, ondulado, etc.).

Análise: Verificar necessidade de desenvolvimento (UX/UI, Front-end) de botão dropdown, lista de tipos de bordas HTML e funções.

Prazo previsto: 5 dias

11 – Tachado

Rasura o texto com um risco no meio.

Análise: Não viável.

12 – Subscrito

Diminui e posiciona o texto na parte inferior da linha (ex: fórmulas químicas — H_2O).

13 – Sobrescrito

Diminui e posiciona o texto na parte superior da linha (ex: expoentes — x^2).

Análise: Ferramentas já implementadas no modal de equação. Verificar necessidade de desenvolver ferramentas para inserir diretamente no texto.

14 – Efeitos de texto e tipografia

Adiciona efeitos como sombra, brilho, contorno e transformações de texto.

Análise: Não viável.

15 – Realce de texto

Aplica marcador colorido por trás do texto.

Análise: Ferramenta existente na ferramenta de comentários. Verificar necessidade de desenvolver ferramentas para inserir diretamente no texto. Onde vai ser visualizado? Vai aparecer no ebook e na trilha?

16 – Cor de texto

Muda a cor da fonte.

Análise: Verificar necessidade de desenvolver ferramentas para inserir diretamente no texto. Onde vai ser visualizado? Vai aparecer no ebook e na trilha?

17 – Marcadores (bullet points)

Cria listas com pontos, símbolos ou ícones.

18 – Numeração

Cria listas numeradas (1, 2, 3...).

Análise: Já implementadas.

19 – Lista de vários níveis

Cria listas com subníveis (ex: tópicos e subtópicos).

20 – Diminuir Recuo

Move o parágrafo para a esquerda.

21 – Aumentar Recuo

Move o parágrafo para a direita.

Análise: Ferramentas já implementadas, funcionam com a tecla 'Tab' e 'Shift + Tab'.

22 – Classificar

Ordena listas em ordem alfabética ou numérica (A–Z / Z–A).

Análise: Não viável.

23 – Mostrar tudo

Exibe caracteres ocultos, como quebras de linha e espaços.

Análise: Possibilidade de alterar o HTML do texto.

Prazo previsto: 6 dias.

24 – Alinhar à esquerda

Deixa o parágrafo alinhado à margem esquerda.

25 – Alinhar ao centro

Centraliza o texto.

26 – Alinhar à direita

Alinha o texto à margem direita.

27 – Justificar

Ajusta o texto igualmente entre as margens.

Análise: Apenas em texto. Demais elementos (iconográfico, links, imagens etc.) utilizam *'flexbox'* e não *'text-align'*.

Prazo previsto: 18 dias.

28 – Espaçamento de linha e parágrafo

Controla espaços entre linhas e entre parágrafos.

Análise: Ferramenta já existente na etapa de diagramação.

29 – Sombreamento

Adiciona fundo colorido ao parágrafo.

30 – Bordas

Aplica bordas ao parágrafo ou tabela (em volta, laterais, superior/inferior).

Análise: Não viável

Resumo de ferramentas:

Implementada: 11 ferramentas

Negrito, itálico, subscrito, sobrescrito, realce de texto, marcadores, numeração, lista de vários níveis, diminuir recuo, aumentar recuo, espaçamento de linha e parágrafo.

Observação: As 11 ferramentas foram implementadas de forma adaptada e condensada, diferentemente do nível de granularidade encontrado em editores de texto completos, como Microsoft Word ou Google Docs. Essa decisão foi discutida e validada no briefing, considerando a necessidade de manter a padronização geral dos conteúdos da editora, simplificar o processo de edição e evitar variações que possam comprometer a diagramação, o fluxo de produção e a consistência visual entre ebook, trilha e demais materiais.

Não viável: 5 ferramentas

Tachado, efeito de texto e tipografia, classificar, sombreamento, bordas.

Falta escopo: 5 ferramentas

Fonte, tamanho de fonte, aumentar fonte, diminuir fonte, cor de texto.

Viável: 9 ferramentas

Maiúscula e minúscula, limpar formatação, sublinhado, estilos de sublinhado, mostrar tudo, alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, justificar.

Prazo total: 68 dias.

Observação: Os prazos previstos referem-se exclusivamente ao desenvolvimento front-end. Além disso, será necessário considerar o tempo de UX/UI, uma vez que a barra de ferramentas passará por mudanças estruturais e visuais significativas, exigindo validação de layout, prototipação e ajustes de usabilidade.

Da mesma forma, algumas funcionalidades podem demandar suporte ou integração com o back-end, o que impacta o cronograma geral.

Por fim, o planejamento deve levar em conta a disponibilidade da equipe e a capacidade de alocação dentro da esteira de projetos, garantindo que as implementações sejam encaixadas conforme prioridades e recursos técnicos do time.
